資料－３

全 体 工 程 表

工事名　：　八丈島一般廃棄物管理型最終処分場工事

会社名 ： 五洋・菊次・共和建設共同企業体
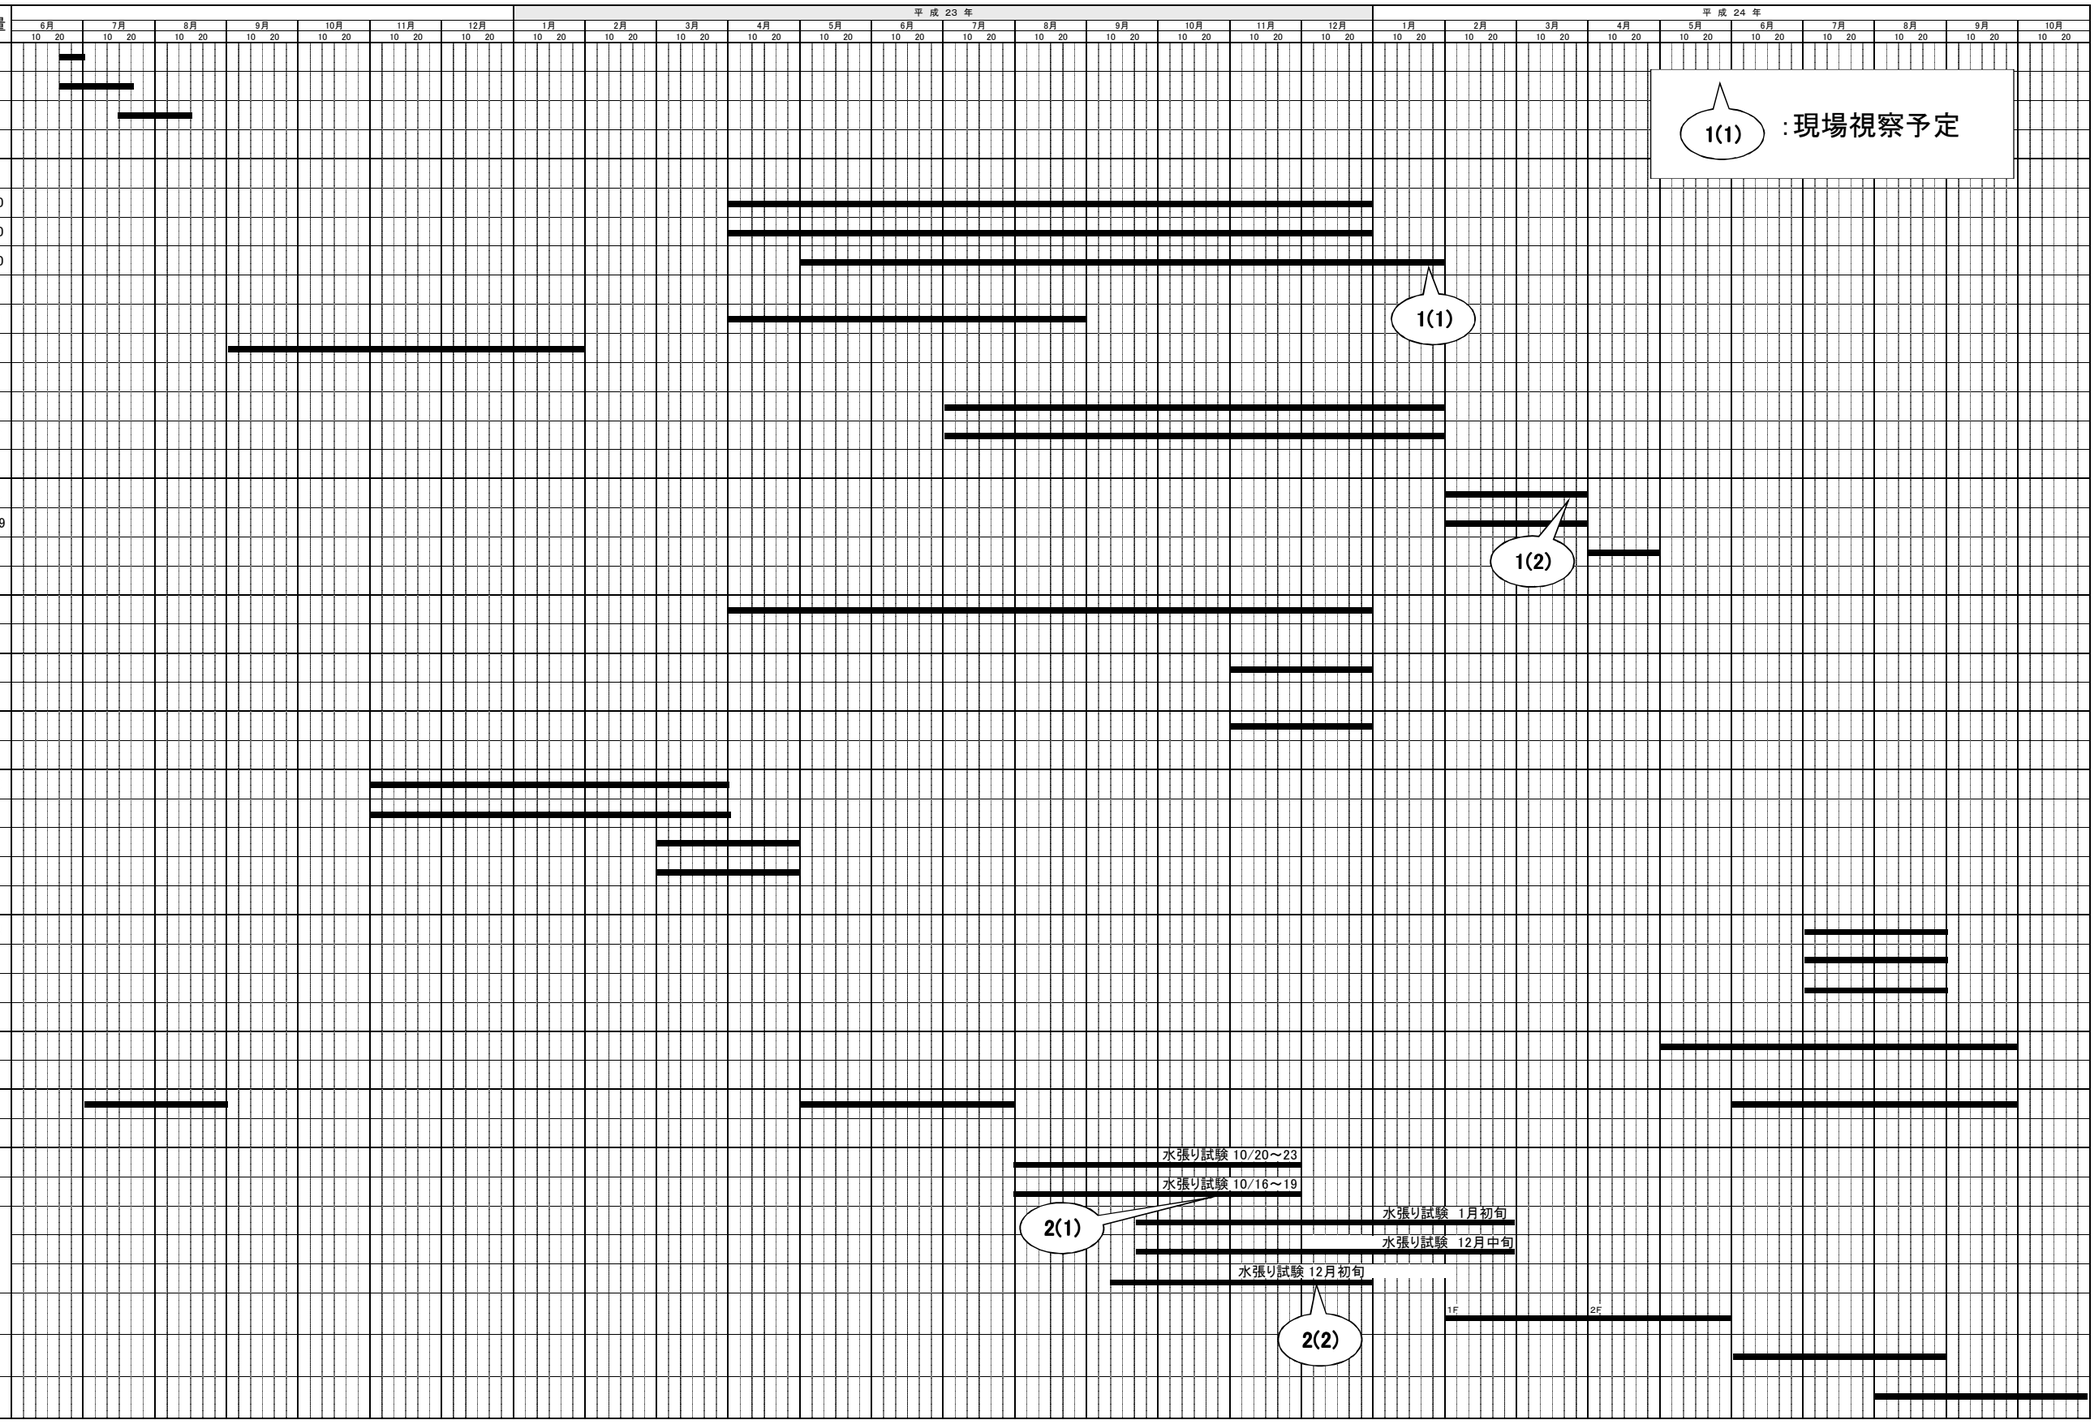
項目			単位	数量
準備工	搬入路整備	整形・拡幅	式	1.0
	伐採・集積・運搬	搬入路	式	1.0
		処分場	式	1.0
擁壁流出防止工	荒造成	改良部		
	土工	掘削・搬出	m3	39,680
		改良・運搬	m3	30,970
		盛土改良	m3	27,870
	表層改良		m3	8,073
	中層改良	本体部	本	2,810
	鋼製法枠		m2	3,940
	枠内厚層基材吹付		m2	3,940
遮水工	シート設置		m2	8,480
	固定工		m	1,039.9
	保護土工		m3	330
雨水排水工			式	1.0
浸出水集排水工			式	1.0
地下水集排水工			式	1.0
防災調整池工	土工	掘削・積込	m3	1,640
	擁壁工		式	1.0
	放流塔		式	1.0
	底張工		式	1.0
道路工	As舗装		m2	1,934
	Con舗装	調整池含む	m2	432
	Gr設置・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置	〃	式	1.0
囲障その他			式	1.0
搬入道路工				
浸出水処理施設工	原水ピット		箇所	1.0
	地下水ピット		箇所	1.0
	調整槽　1		箇所	3.0
	2			
	3			
	建築工事		式	1.0
	電気設備工事		式	1.0
	外溝工事		式	1.0
